

**AUTONOME SECURITY CONTROLE VZW**Erkend **CONTROLEORGANISME**Maatschappelijke zetel : *Ketelstraat 111 – 3454 Rummen*

Tel. 0483/429830

E-mail bureel@asc-controle.be

BTW BE 0826-131-776

IBAN BE 32 7512 0493 7802

Agent-bezoeker belast met het onderzoek : *Peeters Tim TP***VERSLAG VAN EEN HUISHOUELIJKE ELEKTRISCHE INSTALLATIE OP LAAGSPANNING
EN OP ZEER LAGE SPANNING**

AARD ONDERZOEK	VOORSCHRIFTEN
CONTROLEBEZOEK :	BOEK 1 - KB 08/09/2019
	6.5.1 t/m 6.5.7.1

1.- IDENTIFICATIE - INLICHTINGEN			
* Datum onderzoek	25/05/2023	Verslag nummer	Tp2023-0632
* Adres installatie	Korte Goerenstraat 13 3560 Lummen		
* Eigenaar of DNG			
* Installateur	K+ Technics Glabbeekstraat 106 3450 Geetbets	BTW	BE 0683.450.320
* DNB	Fluvius	EAN Code	-
Type van de lokalen	Wooneenheid : Woning Detail : Schema's in bijlage		

2.- BESCHRIJVING VAN DE AANSLUITING		3.- METINGEN EN OPGESTELD MATERIAAL	
Nominale spanning in Volt	400/230	Verspreidingsweerstand v.d. aardinrichting in Ω	7.3
Automaat DNB	40A max	Algemeen isolatieniveau RI in M Ω	10
Voedingskabel Hoofdbord \emptyset	4 x 10 mm ²	Borden	1
Nominale waarde v.d. bescherming v. d. aansluiting	Zie aut DNB	Eindstroombanen	20
Type Aardelektrode	Pennen	Type algemene schakelaar	40A 300mA

4.- VASTGESTELDE INBREUKEN OP DE VOORSCHRIFTEN VAN HET BOEK 1 (KB 08/09/2019)	
6.5.1 t/m 6.5.7.1	
1	Geen

Eventuele afwijkingen waarmee rekening gehouden werd : *Boek 1 – 8.2.1 + 8.2.2*

5.- BESLUIT
1.- De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het BOEK 1 (KB 08/09/2019)
- De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd uiterlijk op 25/05/2048 alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding voor deze datum.
- De ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting geplaatst bij het begin van de installatie waren – werden ontoegankelijk gemaakt door verzegeling. Het(de) ééndraadschema (s) en situatieplan(nen) werd(en) voor gezien getekend.

6.-UITGEVOERDE CONTROLES

Onderzoek conform interne **procedures 23** en werkinstructie **E006** op basis van de vermelde voorschriften bij het uitvoeren van het controlebezoek van een huishoudelijke elektrische installatie.

Identificatie meettoestel : Metrel idmt 06

6 a	Controle op de conformiteit van de uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de voorgelegde schema's.
6 b	Controle van de staat (vastleggingen, beschadigingen...) van het vast geïnstalleerd elektrisch materieel en in het bijzonder voor wat betreft de schakelaars, de stopcontacten, de aansluitingen in de verdeelkasten en verbindingsdozen
6 c	Controle van de beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking
6 d	Controle van de werking van differentieelstroominrichtingen via eigen testinrichting
6 e	Controle van de foutlussen en de juiste aansluiting van de differentieelstroominrichtingen via de opwekking van een foutstroom tussen 2,5 en 2.75 maal de gevoeligheid van het apparaat.
6 f	De controle van de continuïteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd – en bijkomende) en van de beschermingsgeleiders van de stopcontacten en van de vast opgestelde of verplaatsbare elektrische toestellen met vaste standplaats van klasse I
6 g	Visuele controle van vast of vast opgesteld elektrisch materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen
6 h	Visuele controle van verplaatsbaar elektrisch materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen
6 i	De overeenstemming tussen de geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom en de doorsneden van de respectievelijke stroombanen die ze beschermen.

7.- Plichten van de Eigenaars, Beheerders, Huurders

7 a	De eigenaar, beheerder of huurder is verplicht het verslag van het onderzoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie, samen met de ééndraadschema's en de situatieplannen.
7 b	De eigenaar, beheerder of huurder is verplicht in het dossier elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden.
7 c	De eigenaar, beheerder of huurder is verplicht de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeluk van personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit.
7 d	De eigenaar, beheerder of huurder is verplicht, wanneer er inbreuken zijn vastgesteld tijdens het controlebezoek, een nieuw controlebezoek te doen verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de inbreuken verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede bezoek wordt vastgesteld dat er nog inbreuken overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het verslag van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.


8.- NOTA'S

--

9.- DE AGENT-BEZOEKER BELAST MET HET ONDERZOEK

NAAM & handtekening	<i>Peeters Tim TP</i>	Naam: Tim Peeters Reden: keuringsverslag ASC-controls Datum: 25/09/2023 16:22:02 (UTC+02:00:00)
---------------------------	-----------------------	---

Ma Bz 10A3000
 pen 4,30

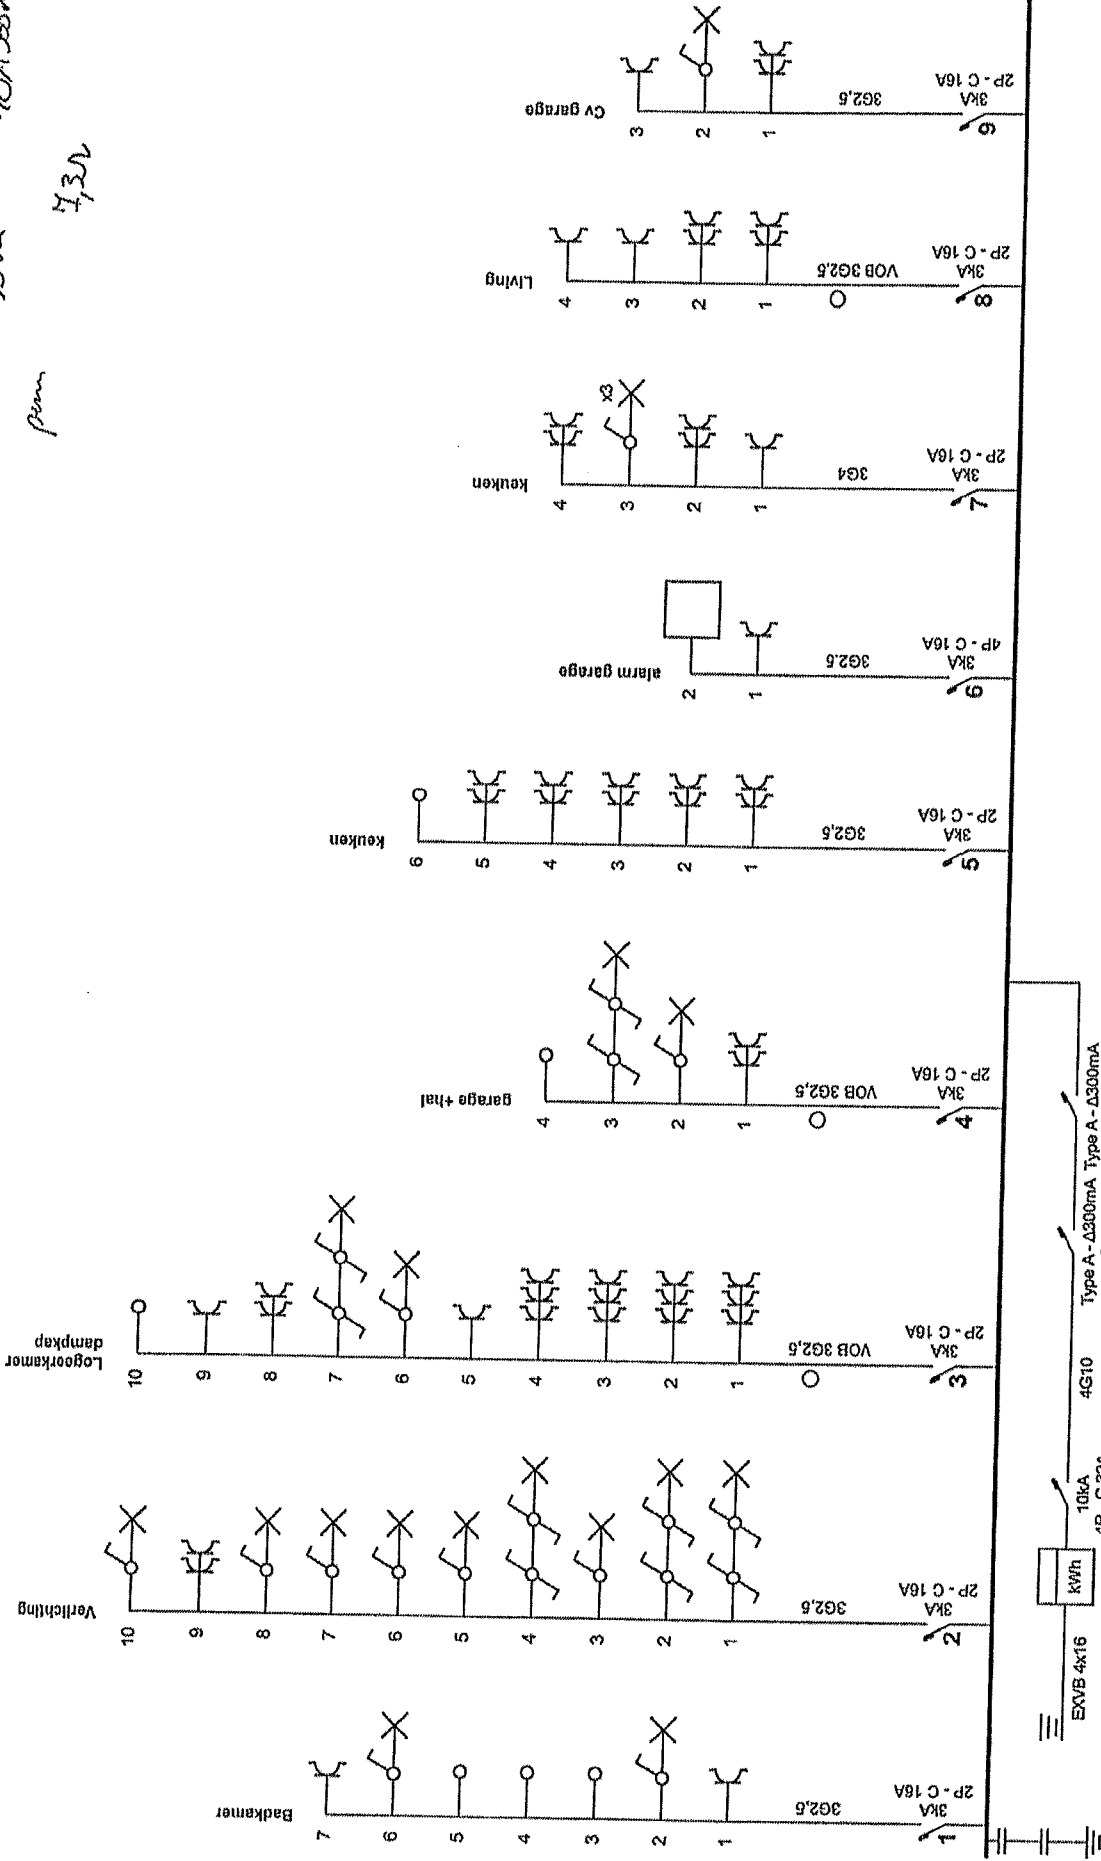

632

Plaats van de elektrische installatie

Korte Groenenstraat 13
 3560 Lummen


Installateur
 K+technics
 Glabbeekstraat 106
 3450 Geetbets

p. 17
 Eendraadschema
 3 x 400V + N ~ 50Hz

EXVB 4x16
 10kA
 4P - C 32A

4G10
 Type A - Δ300mA Type A - Δ300mA
 3kA
 4P - 40A 4P - 40A

A'S'G.C.
 Tim Peeters
 Keurder 25/5/23

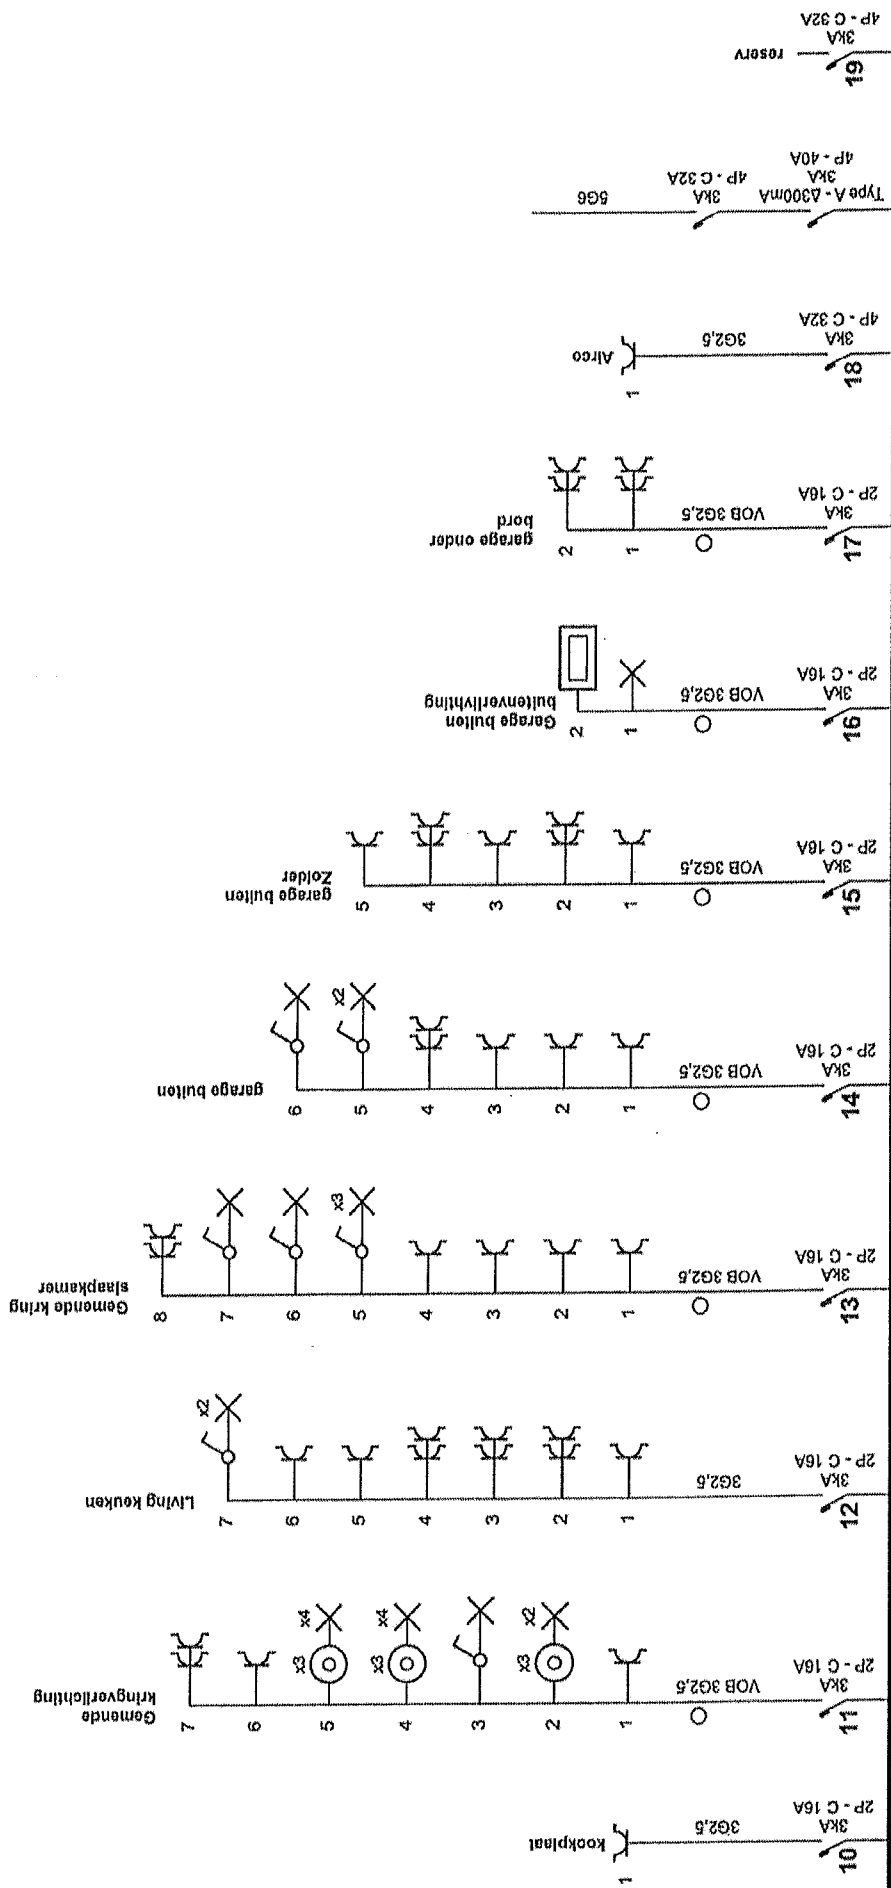


<p>Plaats van de elektrische installatie</p> <p>Korte Groenenstraat 13 3560 Lummen</p>	<p>Installateur</p> <p>K+technics Glabbeekstraat 106 3450 Geetbets</p>
--	--

A³S³C
Tim Peeters
 keurder

p. 2/7
 Eindraadschema
 3 x 400V + N - 50Hz

Gelijkvloers

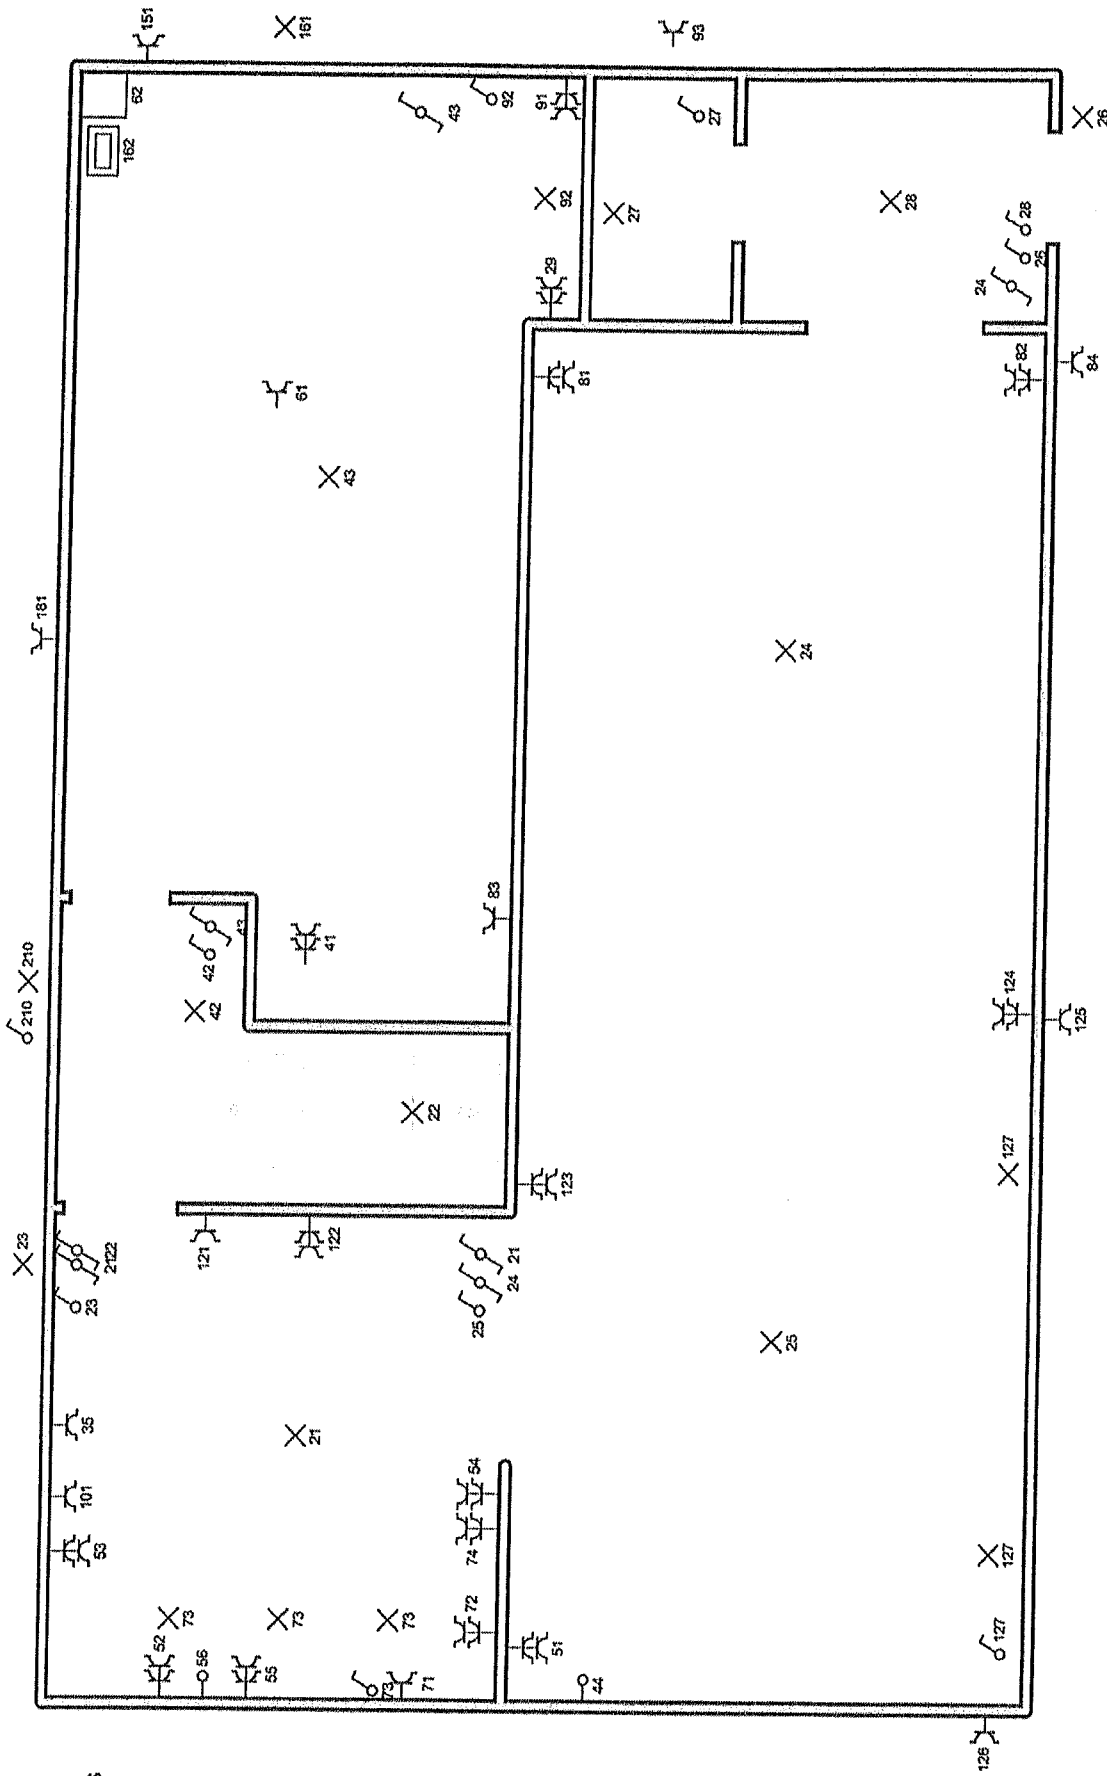

Plaats van de elektrische installatie


Korte Groenenstraat 13
3560 Lummen

Installateur
K+technics
Glabbeekstraat 106
3450 Geerbets




p. 3/7
Situatieschema
3 x 400V + N ~ 50Hz

A.S.C.
Tim Peeters
keurder


Gebouwd volgens de tekening. DTW DE 0650.000.07A

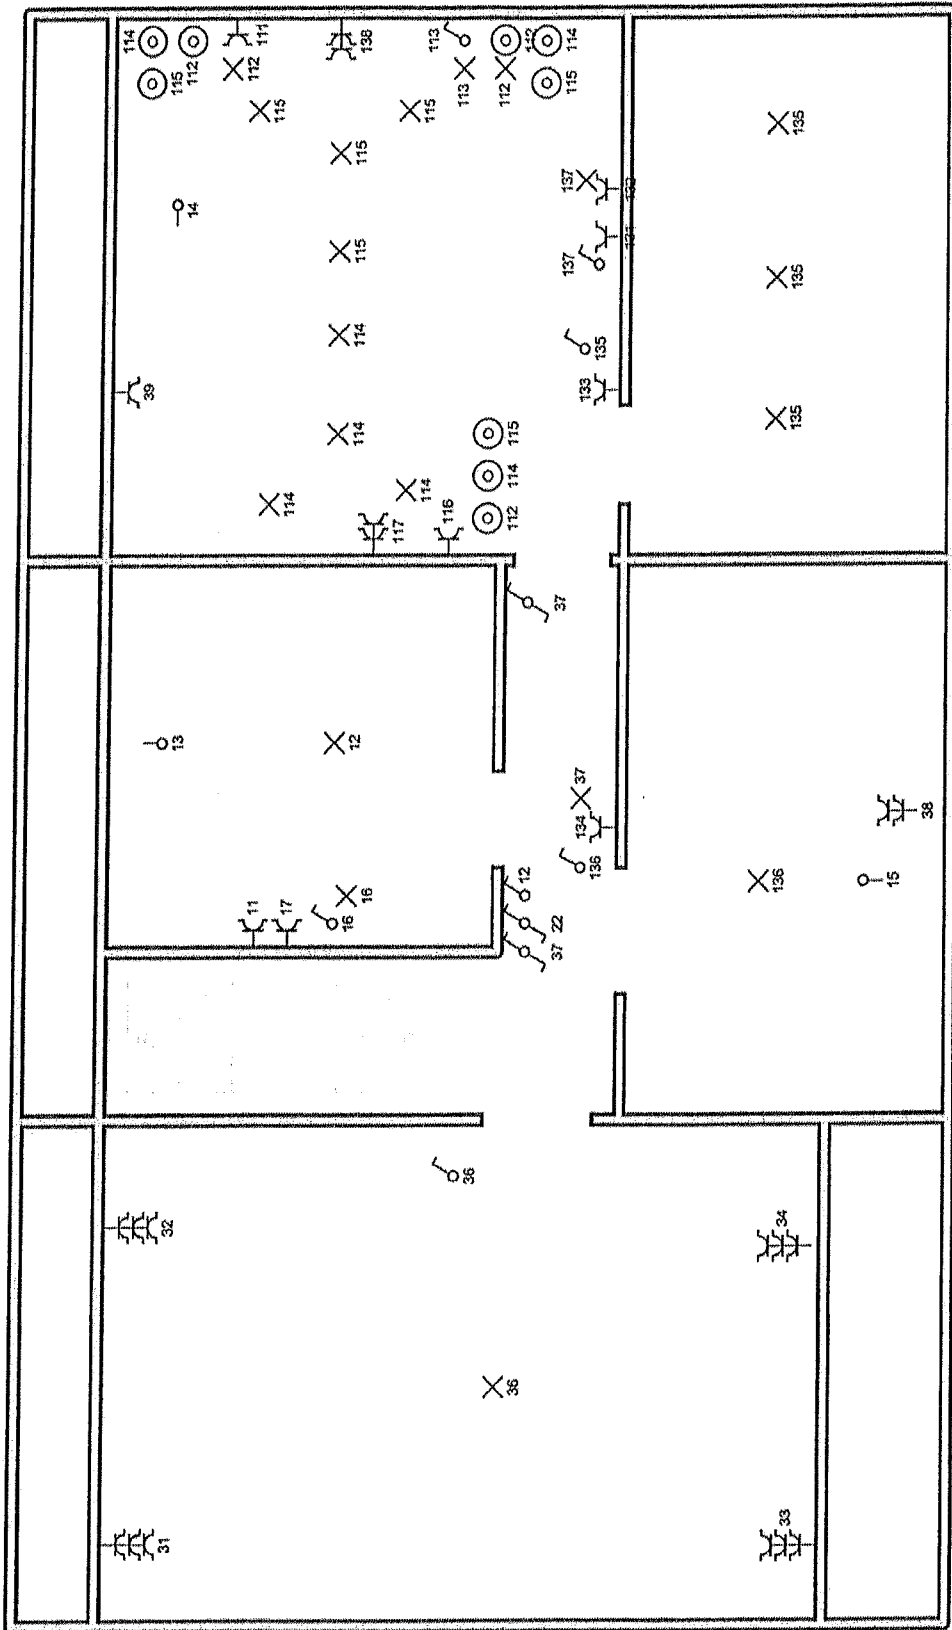

A'S'C.
Tim Peeters
 keurder


<p>Plaats van de elektrische installatie Korte Oversteestraat 13 3560 Lummen</p>	
<p>Installateur K+technics Glabbeekstraat 106 3450 Geelbets</p>	
<p>p. 417 Situatieschema 3 x 400V + N - 50Hz</p>	

tuinhuis

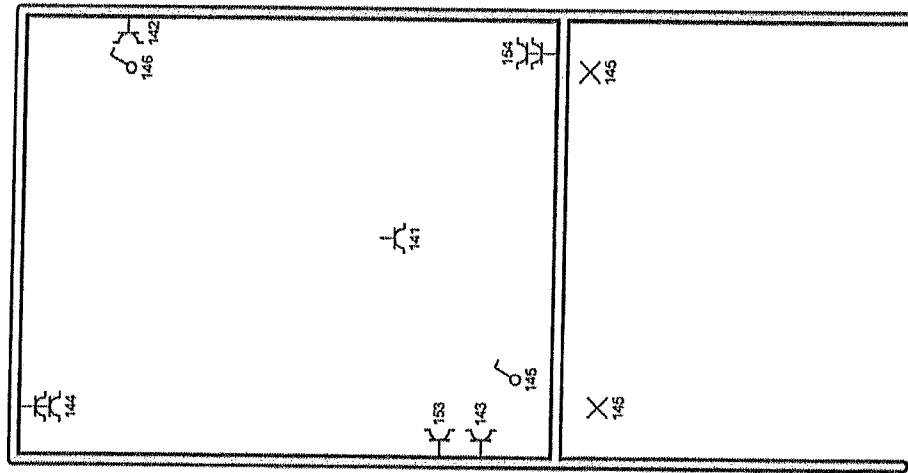

buiten

X 146

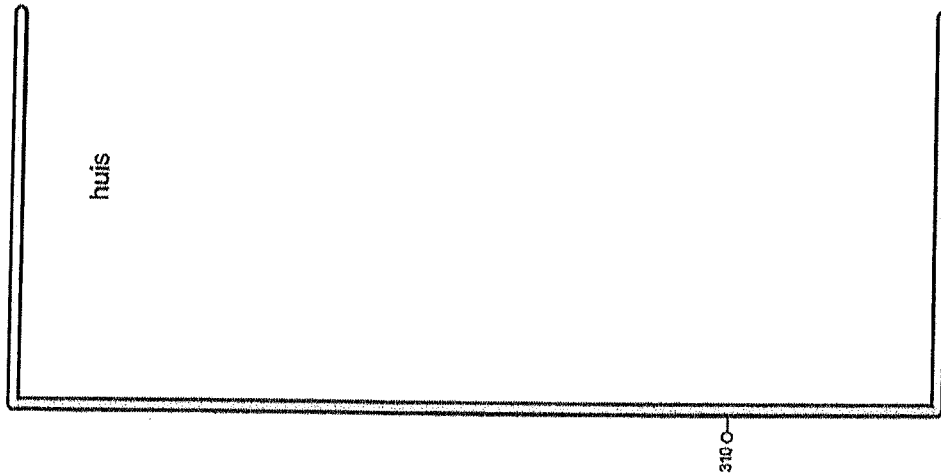

A.S.C.
Tim Peeters
 Keurder


Plaats van de elektrische installatie

Weg 13
3560 Lummen

Installateur
K-technics
Glabbeekstraat 106
3450 Geetbets

p. 57
Situatieschema
3 x 400V + N ~ 50Hz

Zolder

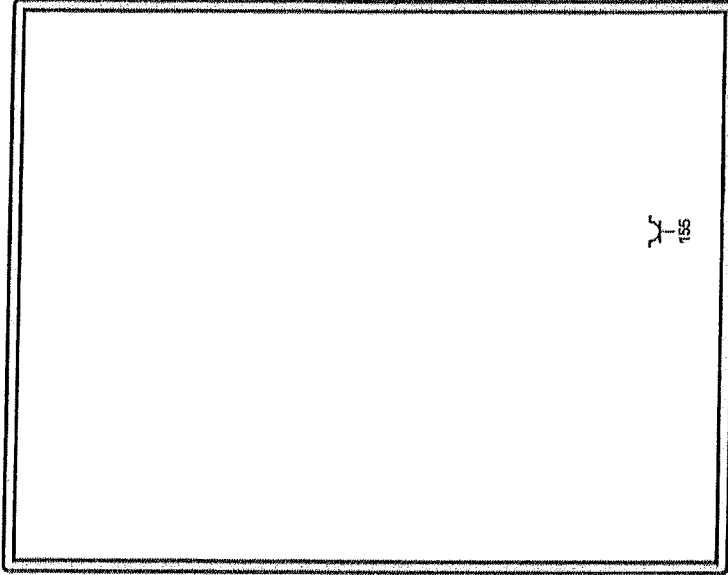


A.S.TMC.
Tim Peeters
Beurder

<p>Plaats van de elektrische installatie Korte Groenenstraat 13 3560 Lummen</p>	<p>Installeateur K+technics Glabbeekstraat 106 3450 Geetbets</p>	<p>p. 67 Situatieschema 3 X 400V + N - 50Hz</p>
---	--	---

Getuimd met handtekening van de installateur op: DTW DE 0650 000 070

- 1 Badkamer
- 2 Verlichting
- 3 Logeerkamer dampkap
- 4 garage +hal
- 5 keuken
- 6 alarm garage
- 7 keuken
- 8 Living
- 9 Cv garage
- 10 kookplaat
- 11 Gemende kringverlichting
- 12 Living keuken
- 13 Gemende kring slaapkamer
- 14 garage buiten
- 15 garage buiten Zolder
- 16 Garage buiten buitenverfijning
- 17 garage onder bord
- 18 Airco
- 19 reserv

A²S²C²
Tim Peeters
 keurder

Plaats van de elektrische installatie Korte Groenendaat 13 3560 Lummen		Installateur K+Technics Glabbeekstraat 106 3450 Geetbets	p. 777 Lijst Kringen 3 x 400V + N ~ 50Hz
--	--	---	--

